



Bauabschnitt 1


- Schritt 1:
- Erstellung Zufahrt und Rammplanum (nicht dargestellt)
- Einbau Spundwand

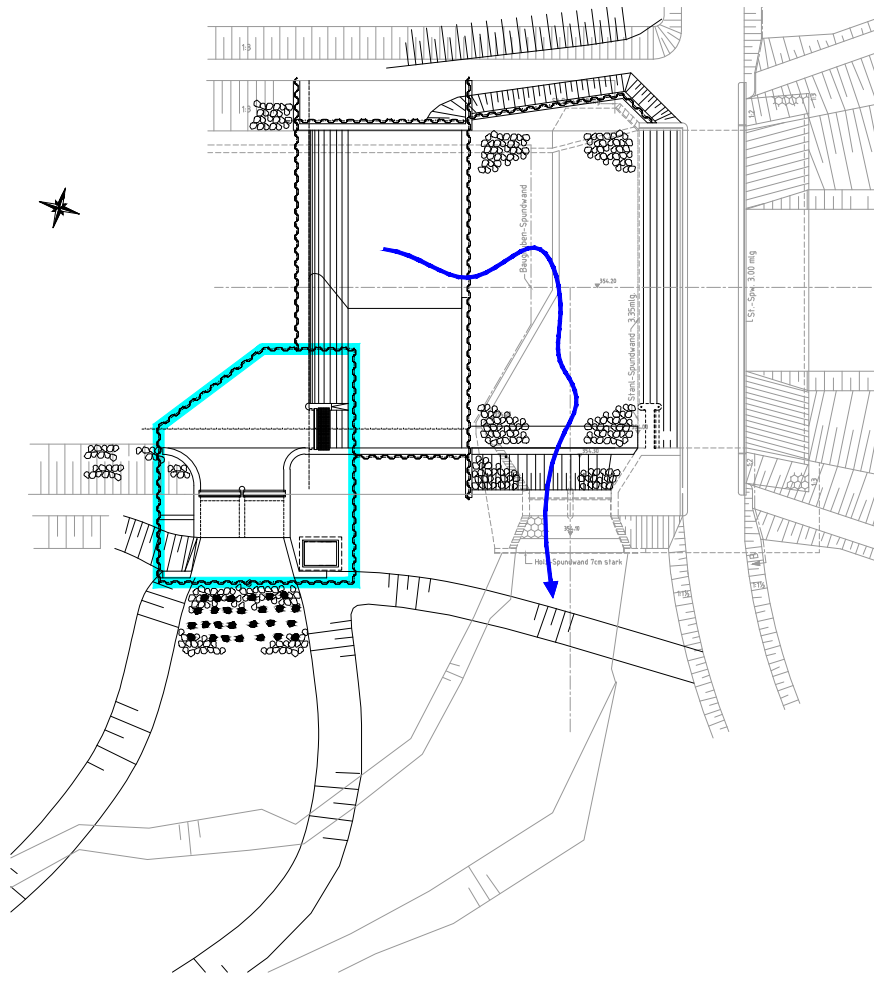


Schritt 8:
- Teilausbau Gurtung

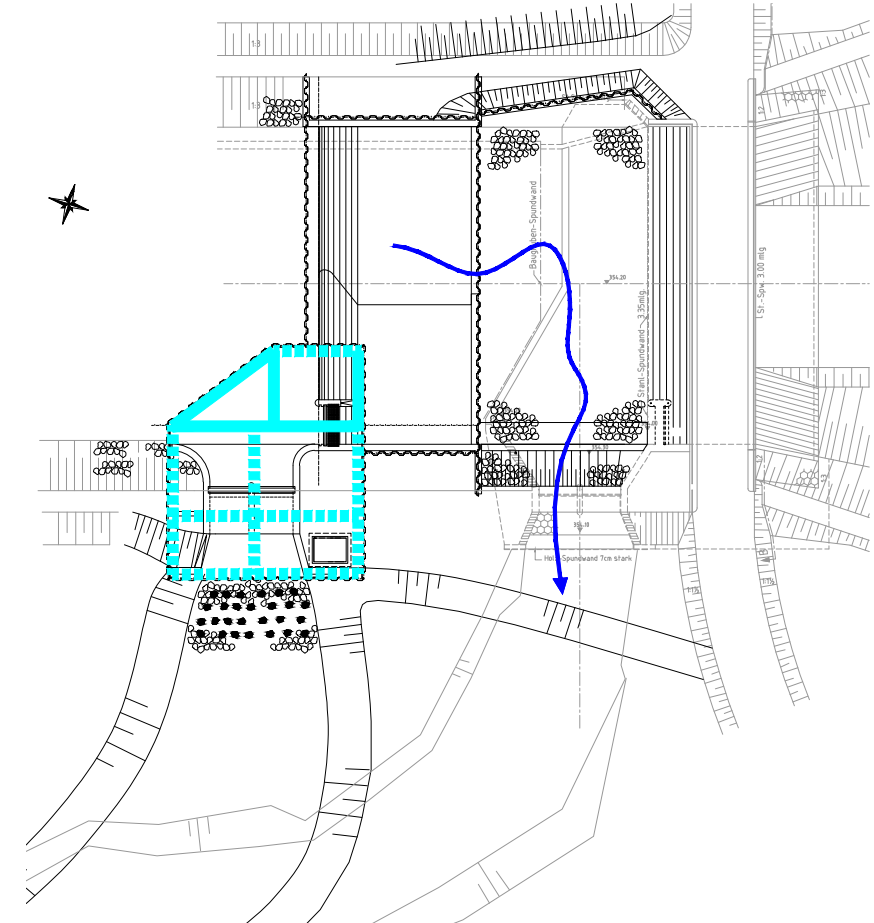


- Schritt 2:
- Teilaushub bis Unterkante Gurtung

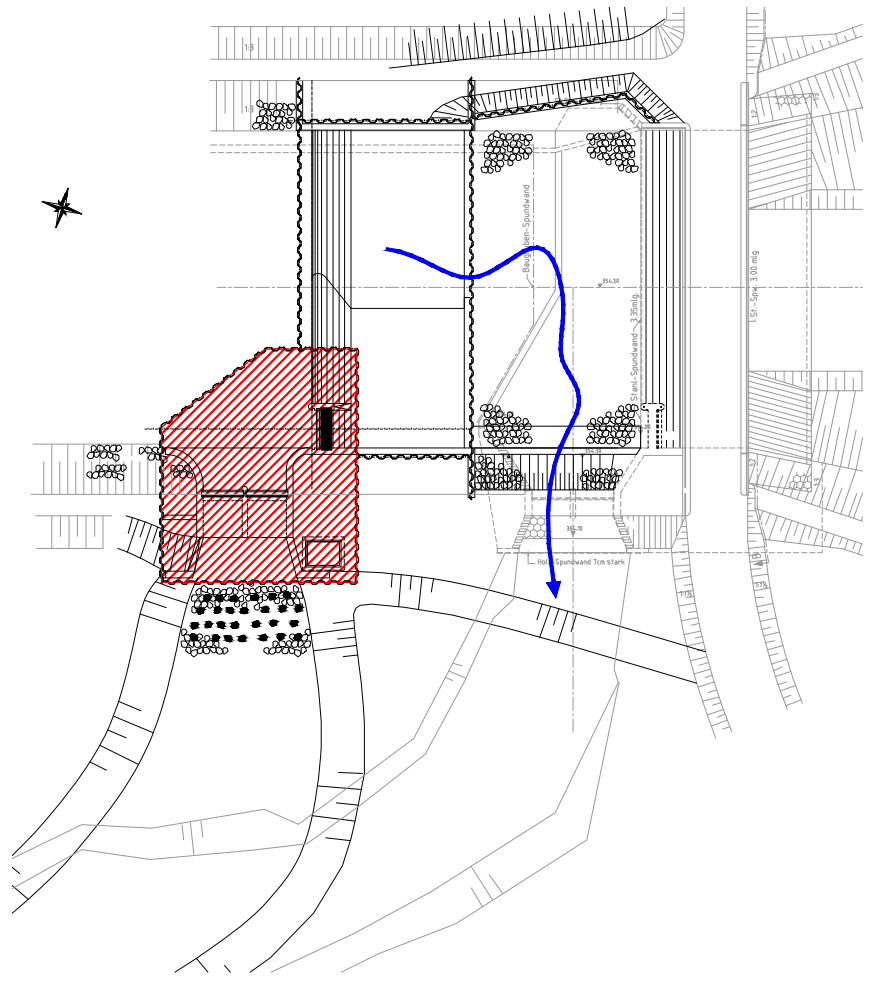


Schritt 9:
- Erstellung der aufgehenden Betonbauteile

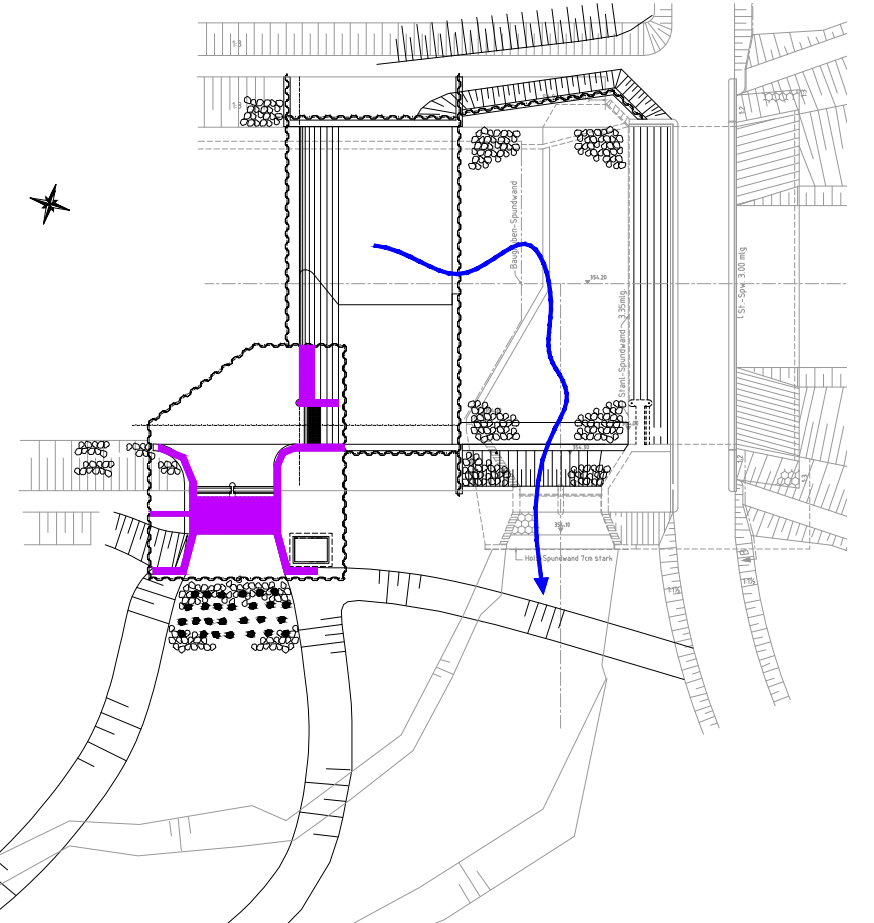


- Schritt 3:
- Einbau Gurtung

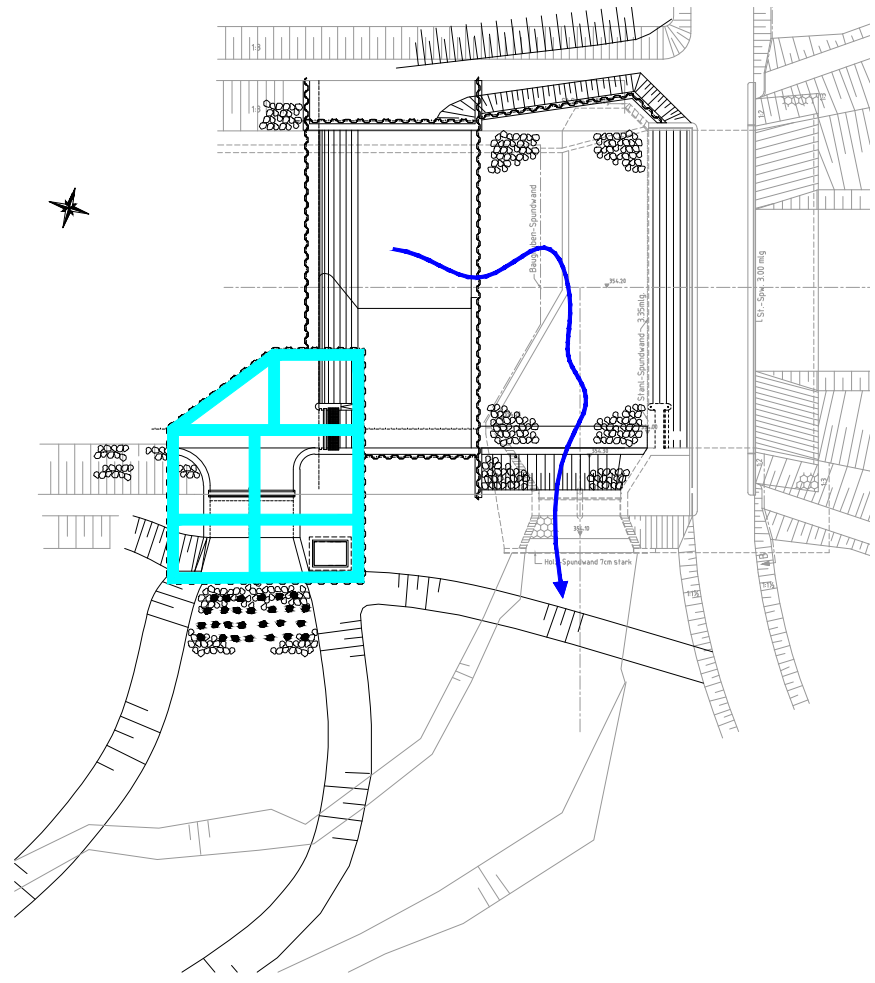


Schritt 10:
- Baugrubenvfüllung

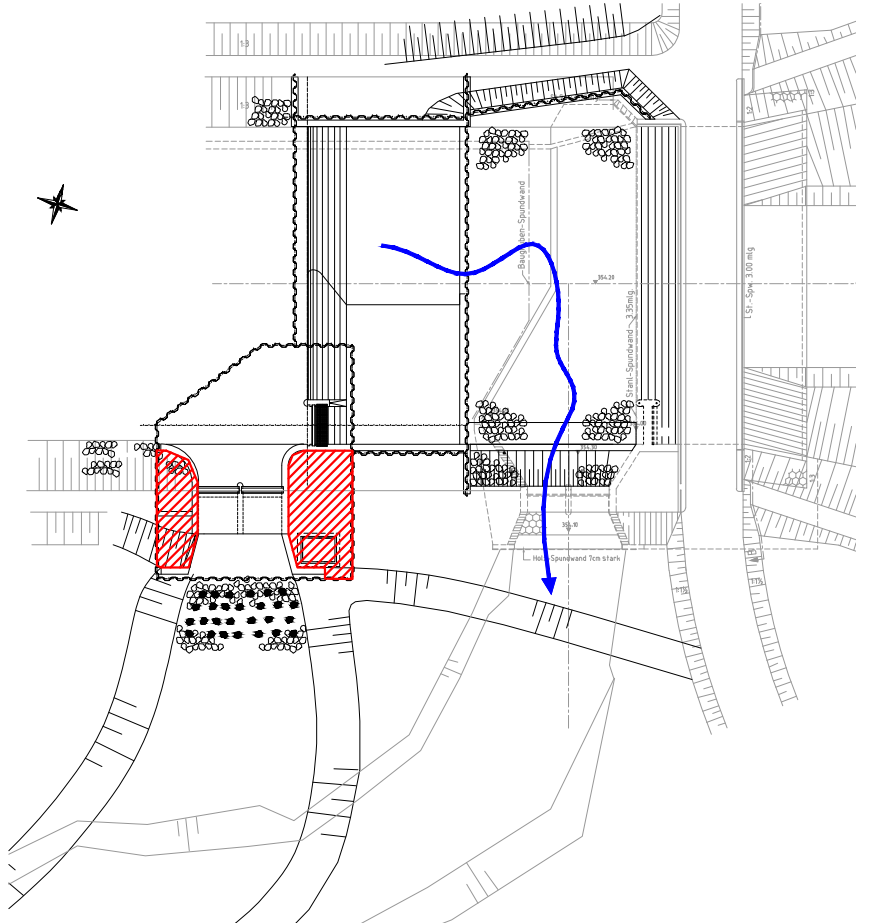


- Schritt 4:
- Restaushub auf Endniveau (2 verschiedene Höhen innerhalb der Baugrube)

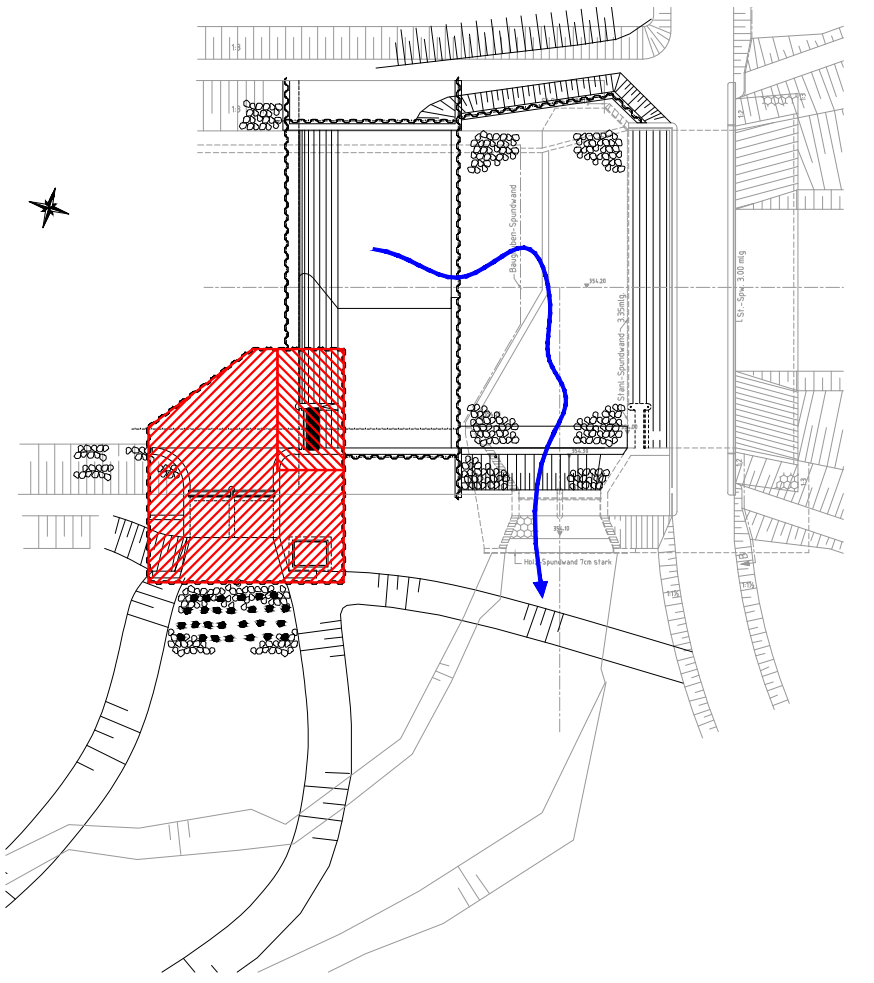


Schritt 11:
- Vormontage Anlagentechnik
- Verguss Stahlwasserbau
- Hauptmontage Anlagentechnik

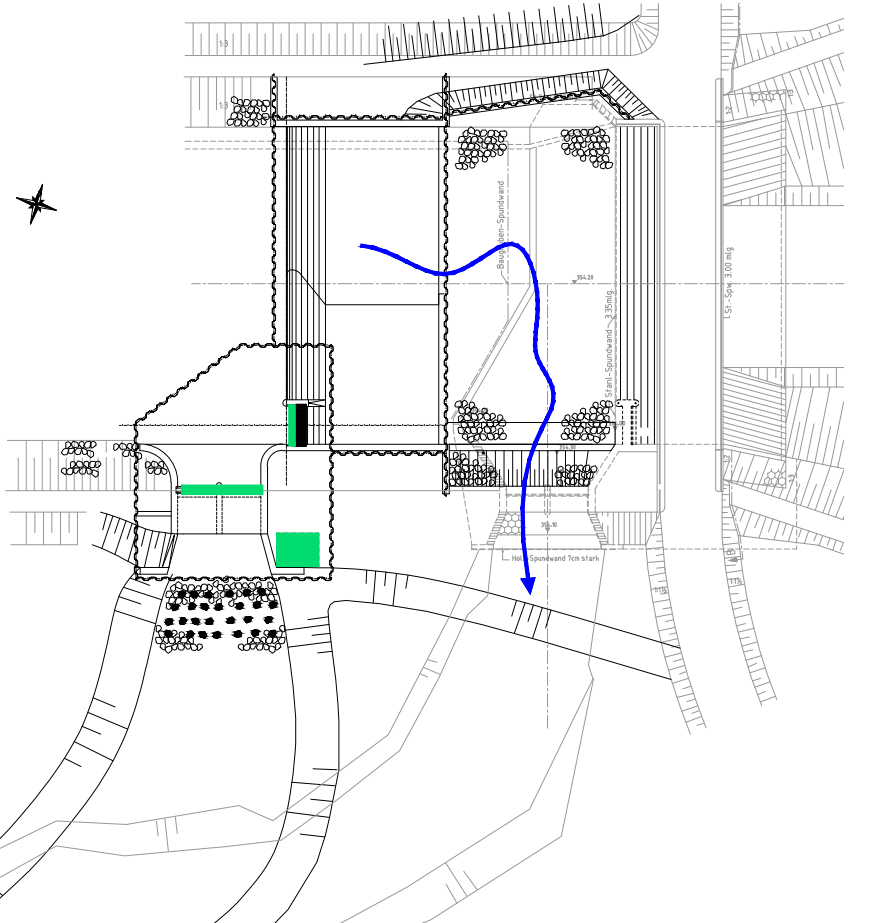


- Schritt 5:
- Erstellung Bodenplatte und Wehrrücken bis Höhe GA-Sohle

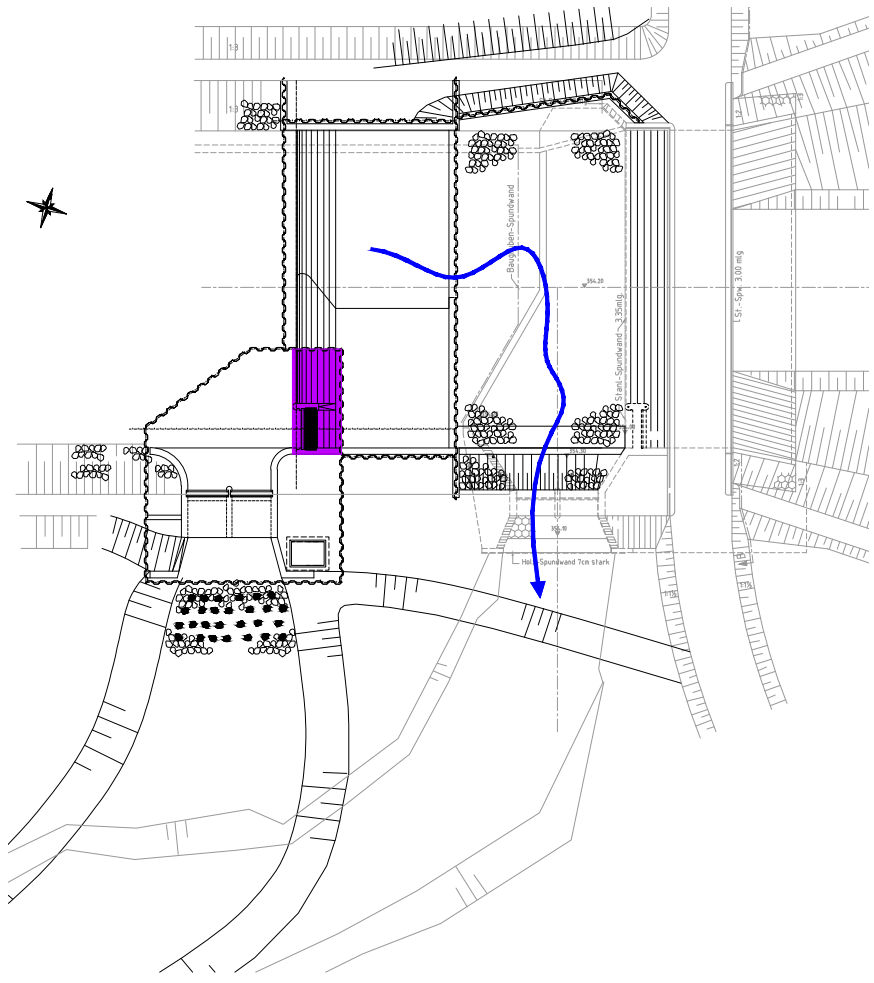


Schritt 12:
- Ausbau Rammplanum (nicht dargestellt)
- Flutung bei geschlossener Einlaufschütz (nicht dargestellt)
- Ausbau Spundwand

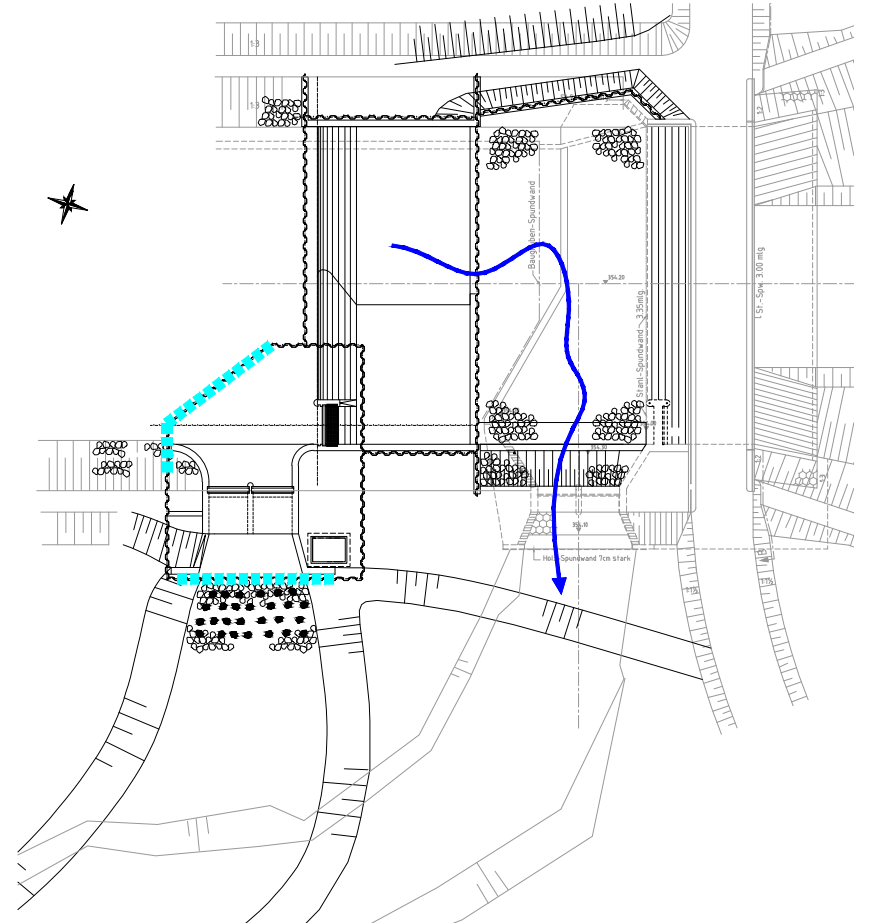


- Schritt 6:
- Teilverfüllung innerhalb der Baugrube

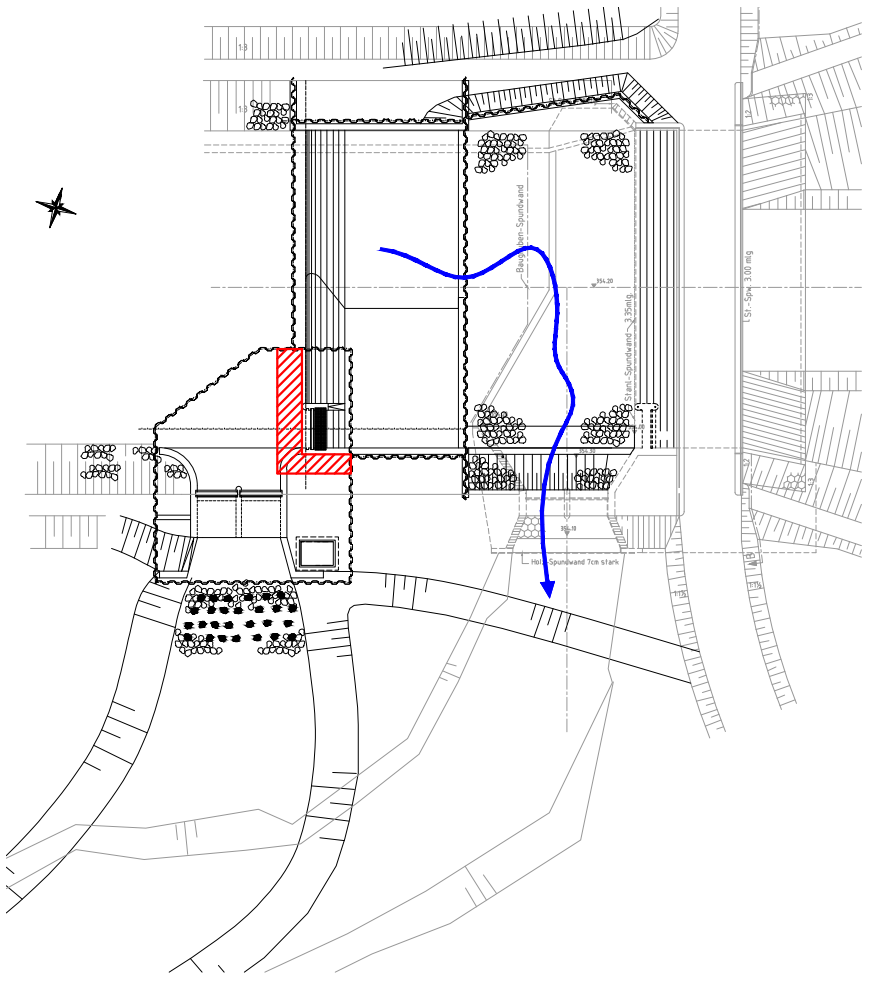


Schritt 13:
- Erdaushub

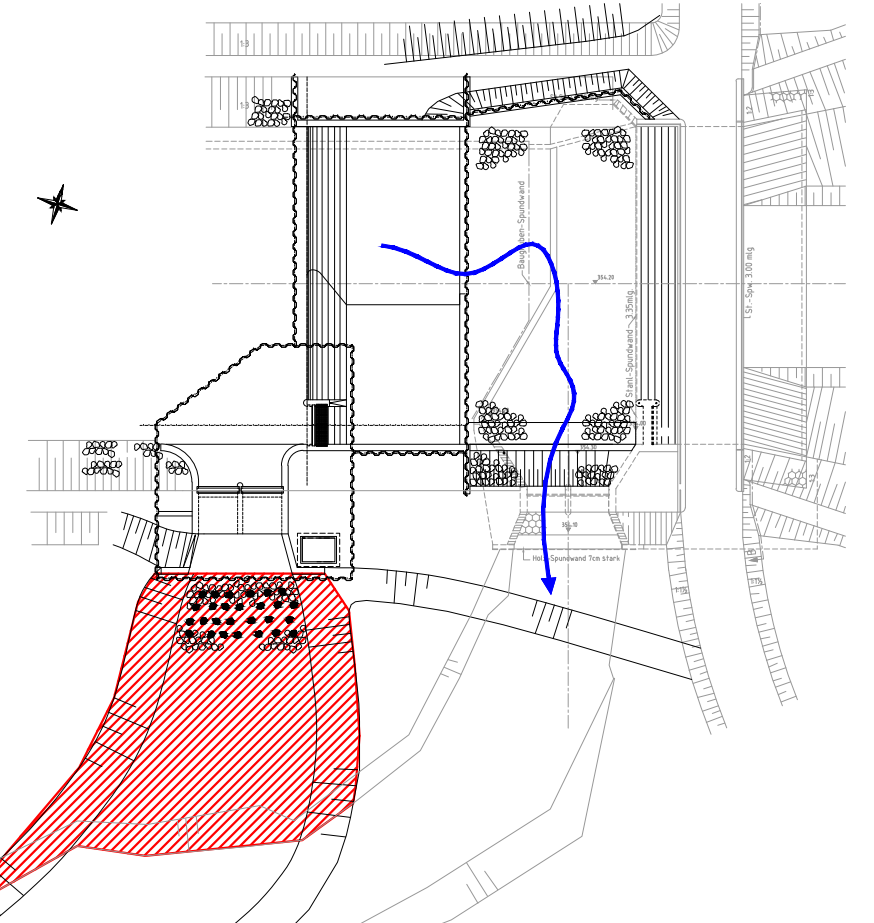

- Schritt 7:
- Erstellung Bodenplatte

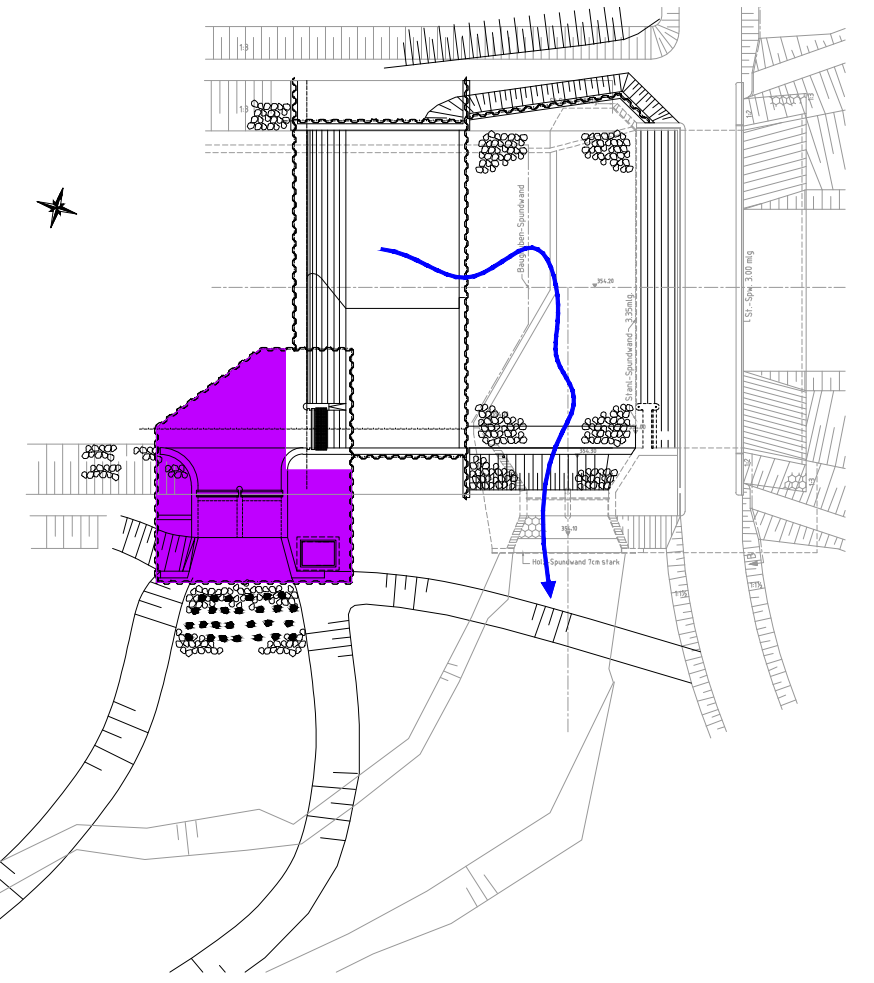


Schritt 14:
- Nassinbetriebnahme des neuen Einlaufbauwerks

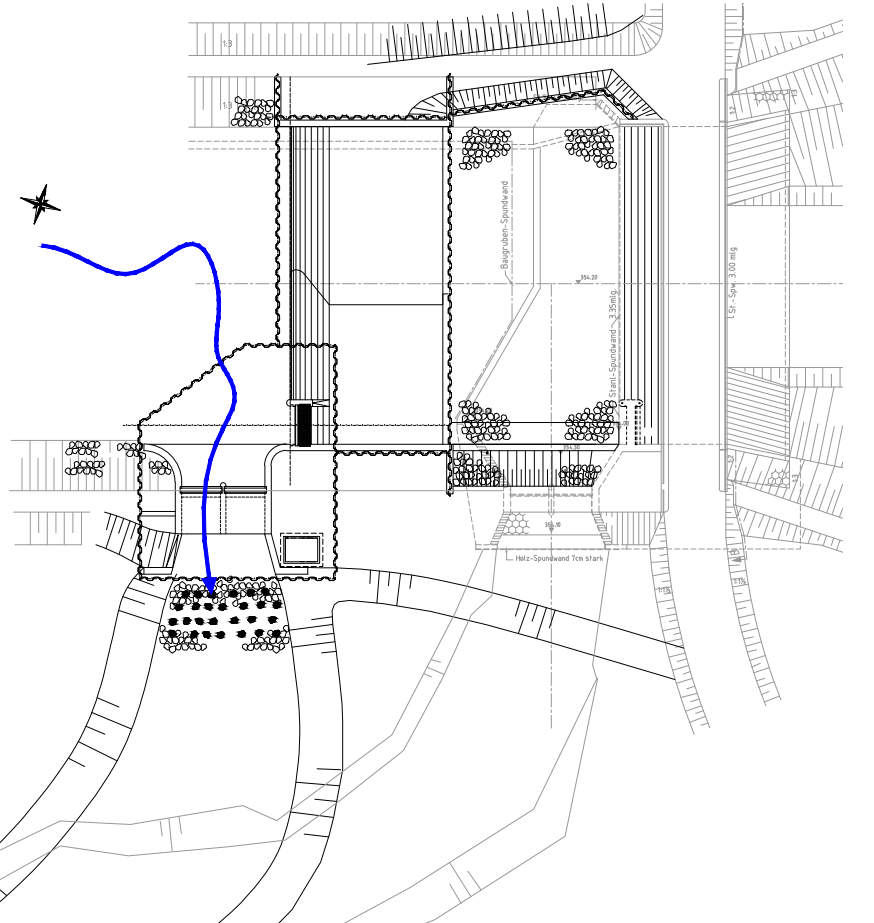


Bauabschnitt 2


- Schritt 1:
- Erstellung Zufahrt und Rammplanum (nicht dargestellt)
- Einbau Spundwand

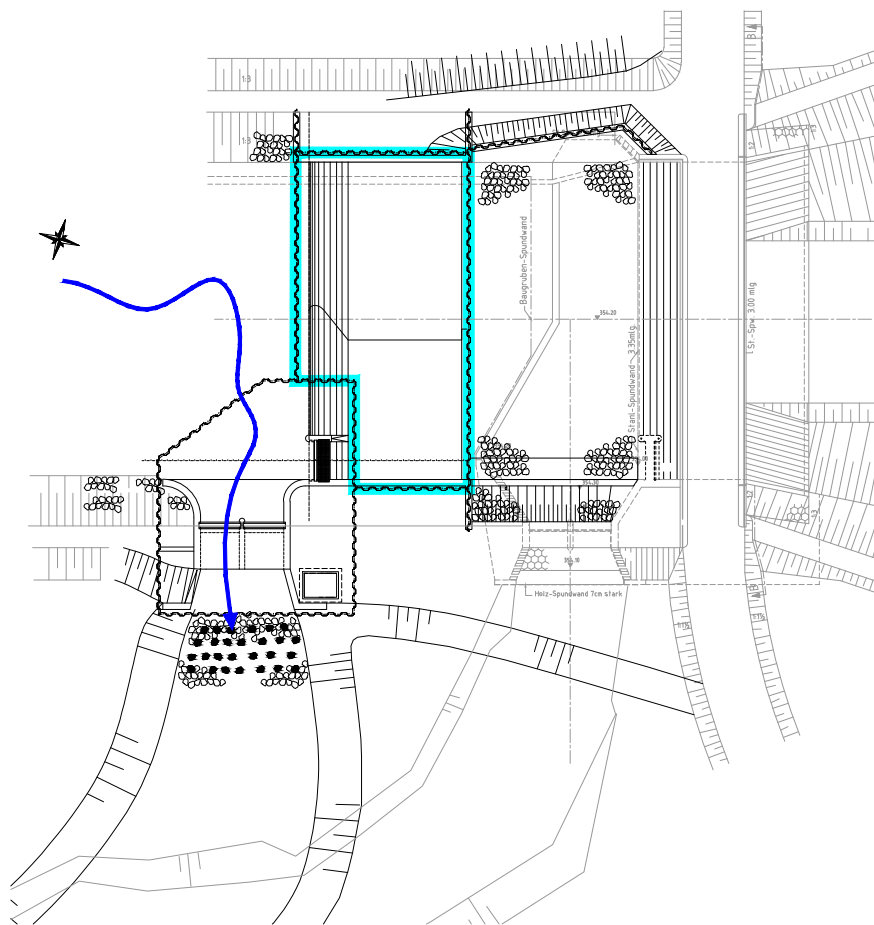


Schritt 6:
- Erstellung Wehrrücken und Seitenwände bis 354.20

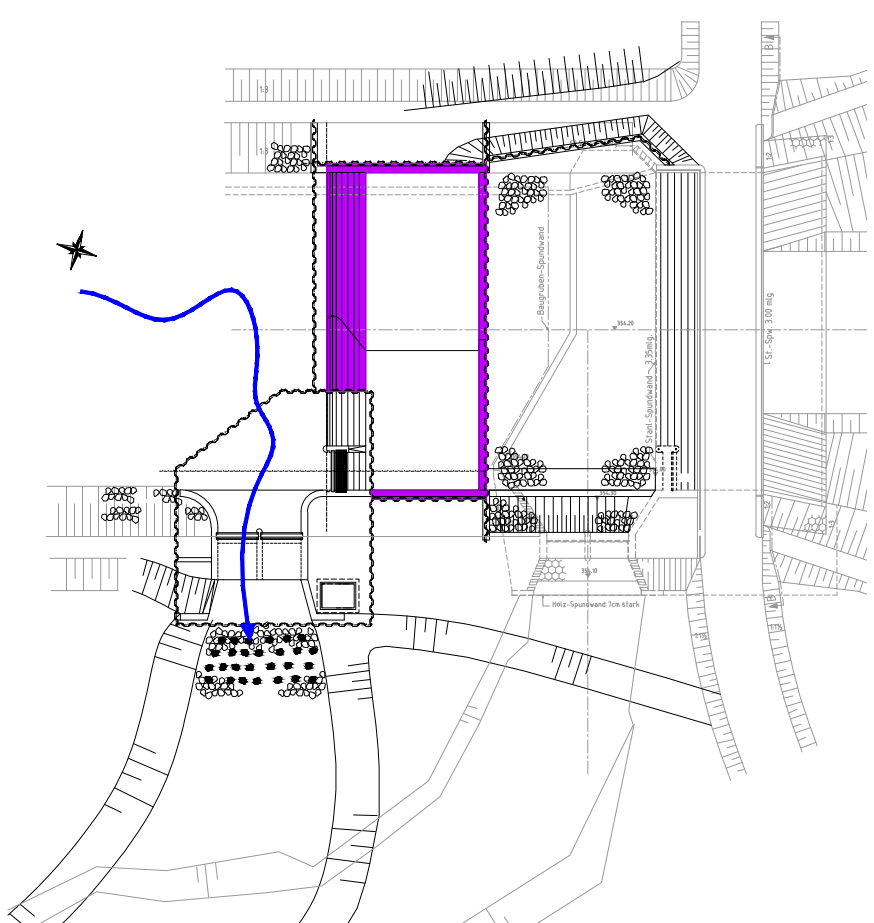


- Schritt 2:
- Teilaushub bis Unterkante Gurtung

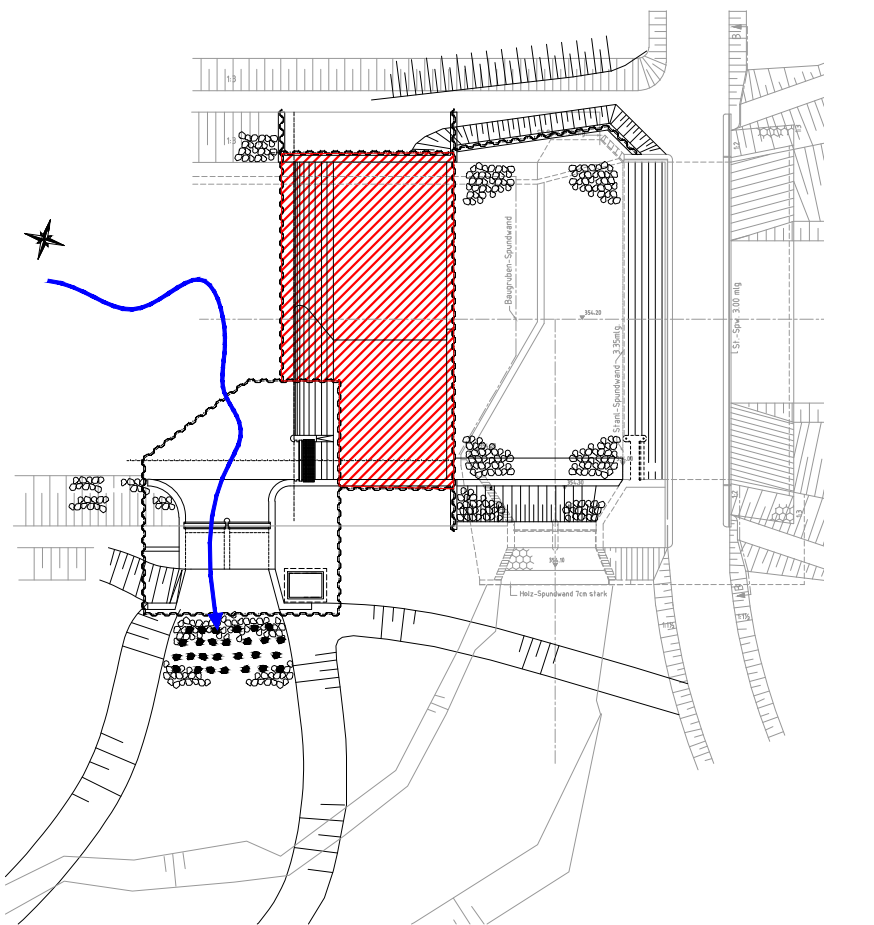


Schritt 7:
- Ausbau Gurtung

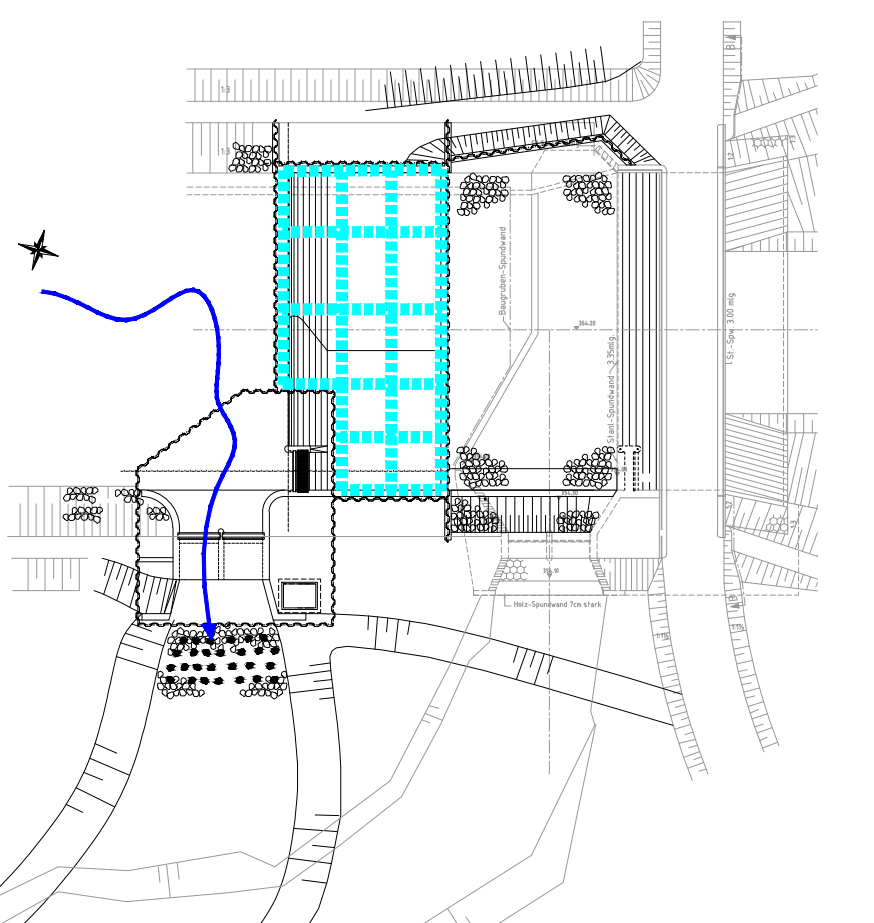


- Schritt 3:
- Einbau Gurtung

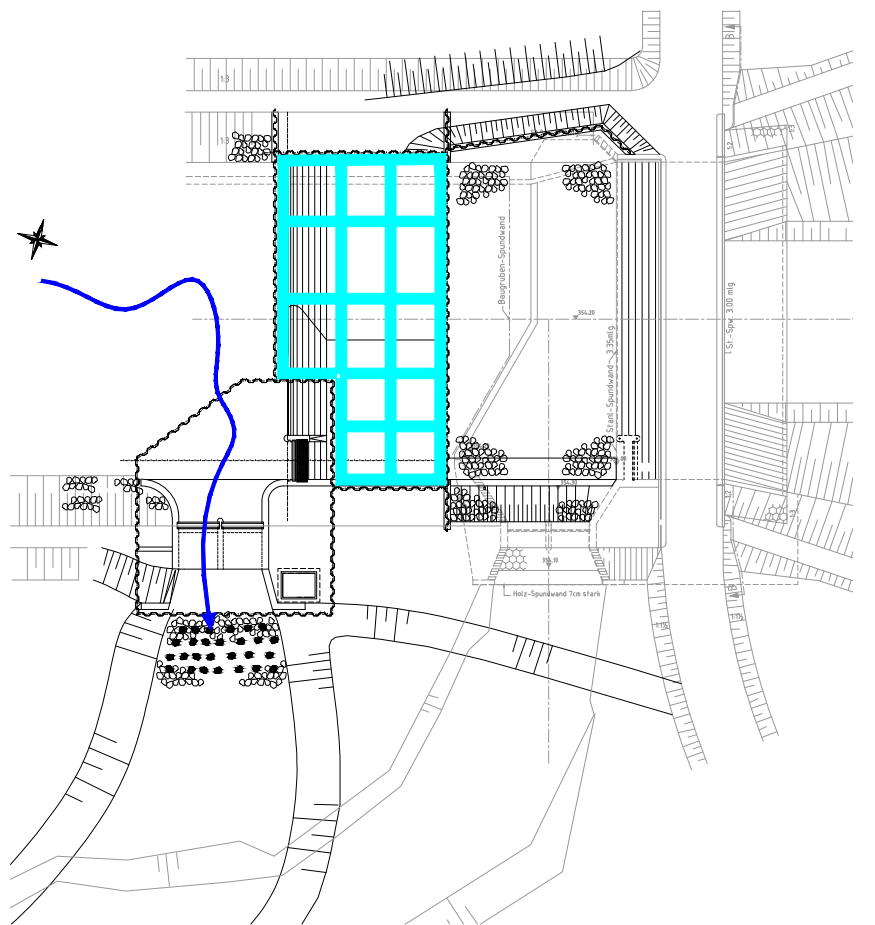


Schritt 8:
- Erstellung Wehrrücken u. Seitenwände ab 354.20 bis Endhöhe

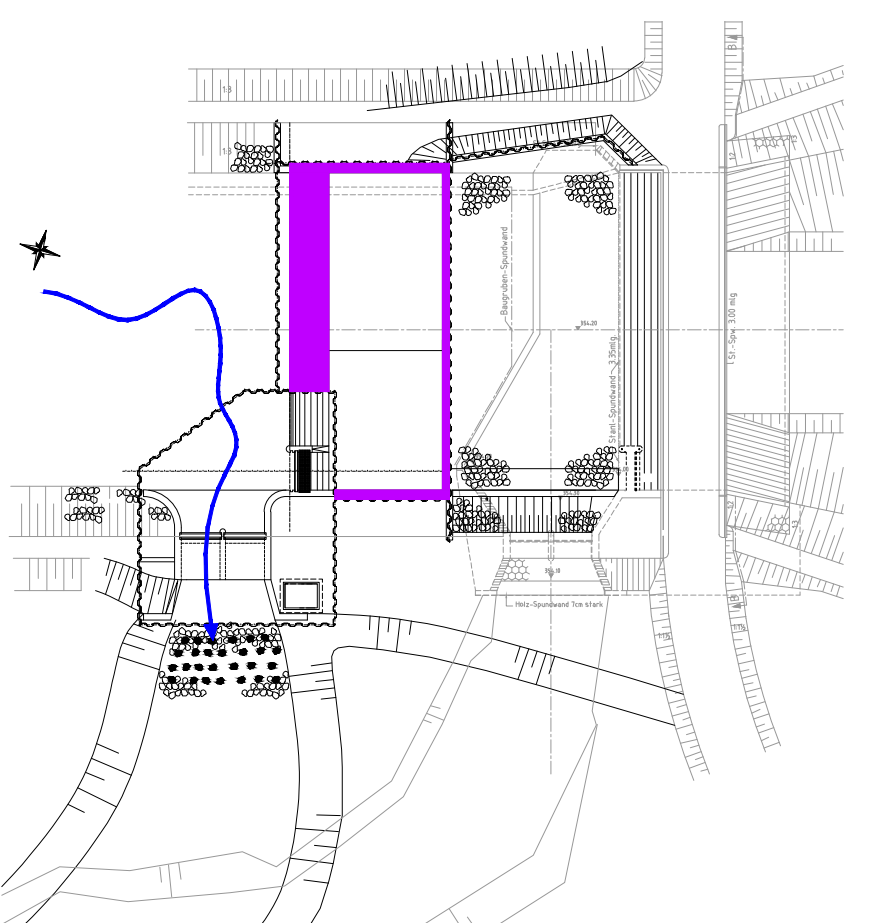


- Schritt 4:
- Restaushub auf Endniveau

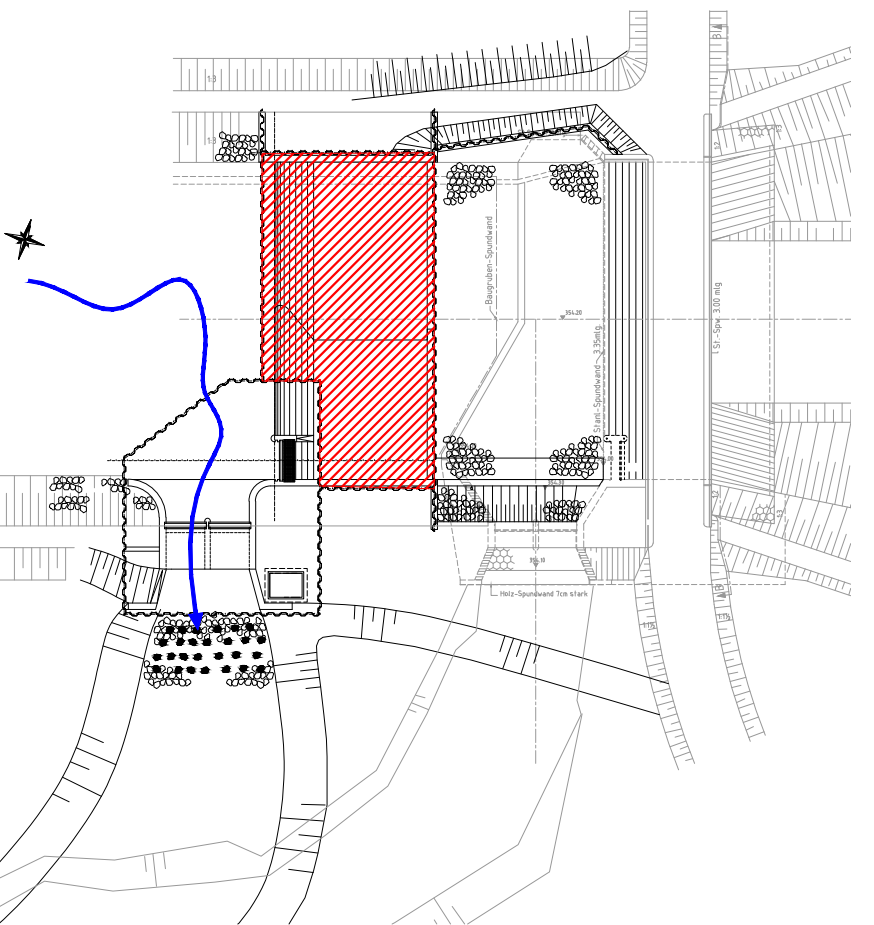

Schritt 9:
- Ausbau Rammplanum (nicht dargestellt)
- Ausbau Spundwand

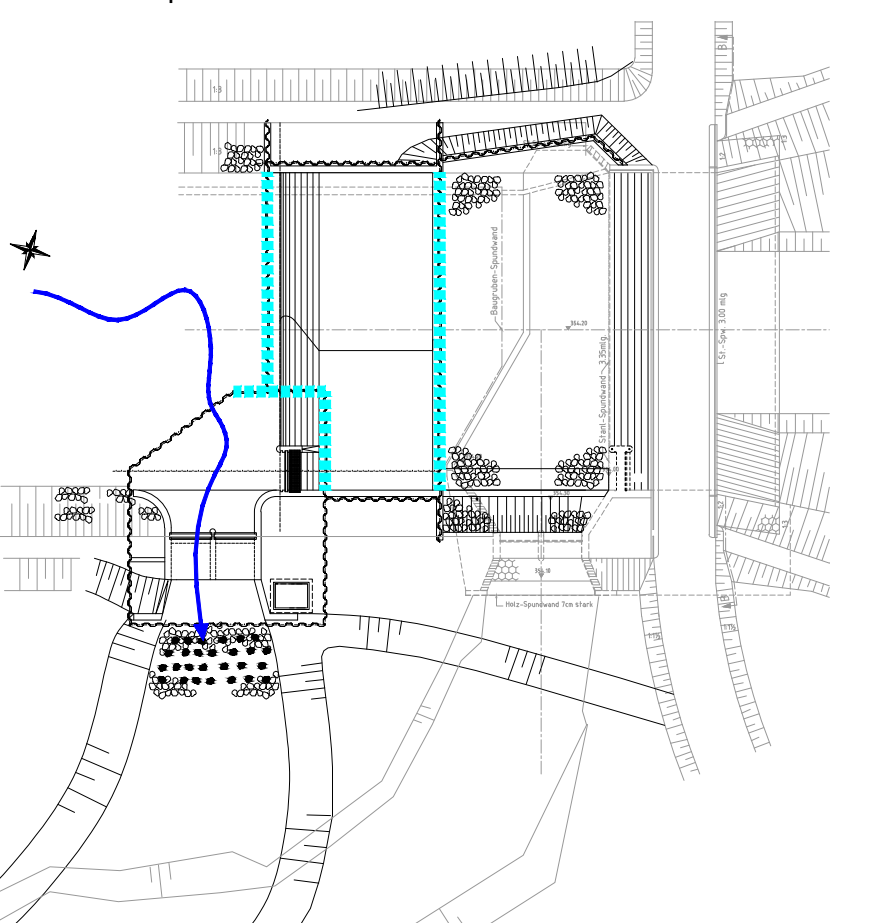

- Schritt 5:
- Erstellung Bodenplatte

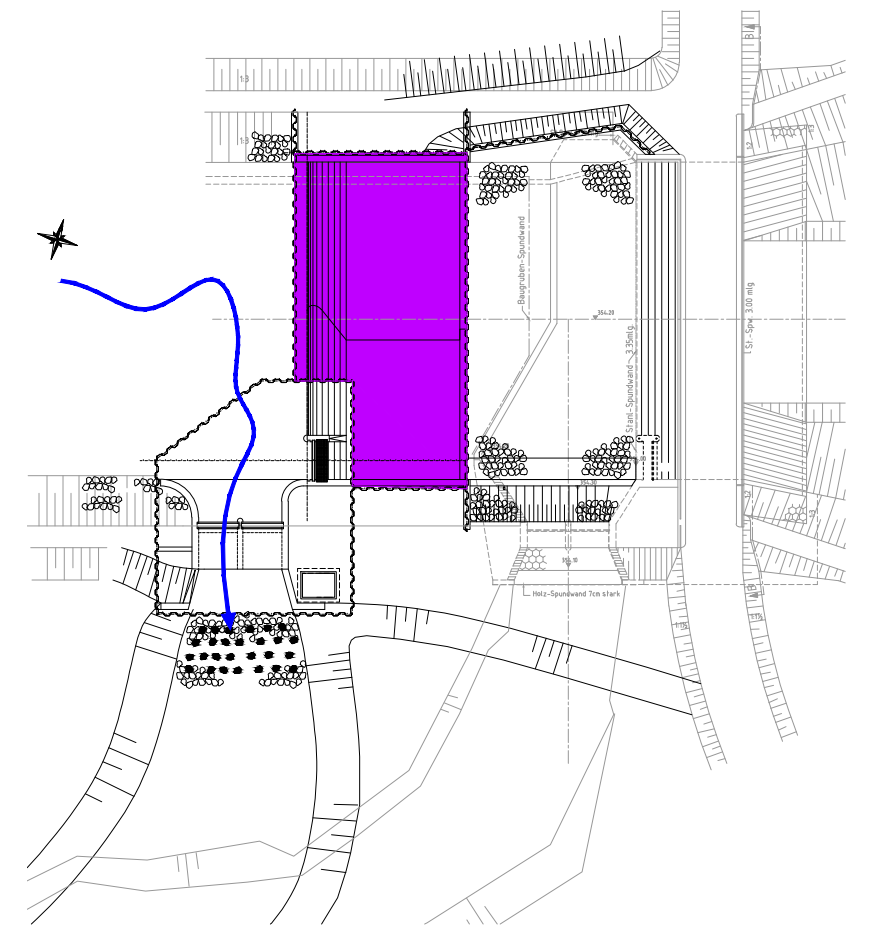


LEGENDE	
Entwurf	
■	: Betonarbeiten
—	: Spundwandarbeiten und Gurtung (Einbau)
- - -	: Spundwandarbeiten und Gurtung (Ausbau)
▨	: Erdarbeiten (Aushub, Verfüllung)
■	: Montagearbeiten Anlagentechnik
▨	: Erdarbeiten (Aushub, Verfüllung)
→	: Wasserführung


PLANGRUNDLAGE		
Nr.	Symbol	Plan
1	s. Legende	DFK Stand 05/2017
2		Vektorisierter Bestandsplan "Wehr bei km 8.850" vom 28.04.58
3	-	Dig. Orthophoto, Aufnahme datum 17.07.2013
4	s. Sparten- legende	Spartenauskunft vom Juli 2014: a.) Bayerwerk => siehe Spartenlegende b.) Gemeinde Eichendorf => keine Gasleitung c.) Energienetz Bayern => keine Gasleitung
5	-	Querprofilaufnahmen Plan 1404/001 vom 17.07.2014 von IB Ussing
6	-	Vermessung von Geopius vom Juli 2015
7	-	Geologische Bohrungen B1 und B2 vom März 2017

Bauabschnitt 3


- Schritt 1:
- Erstellung Rammplanum (nicht dargestellt)
- Einbau Spundwand und Kopfbalken linke Auslaufseite

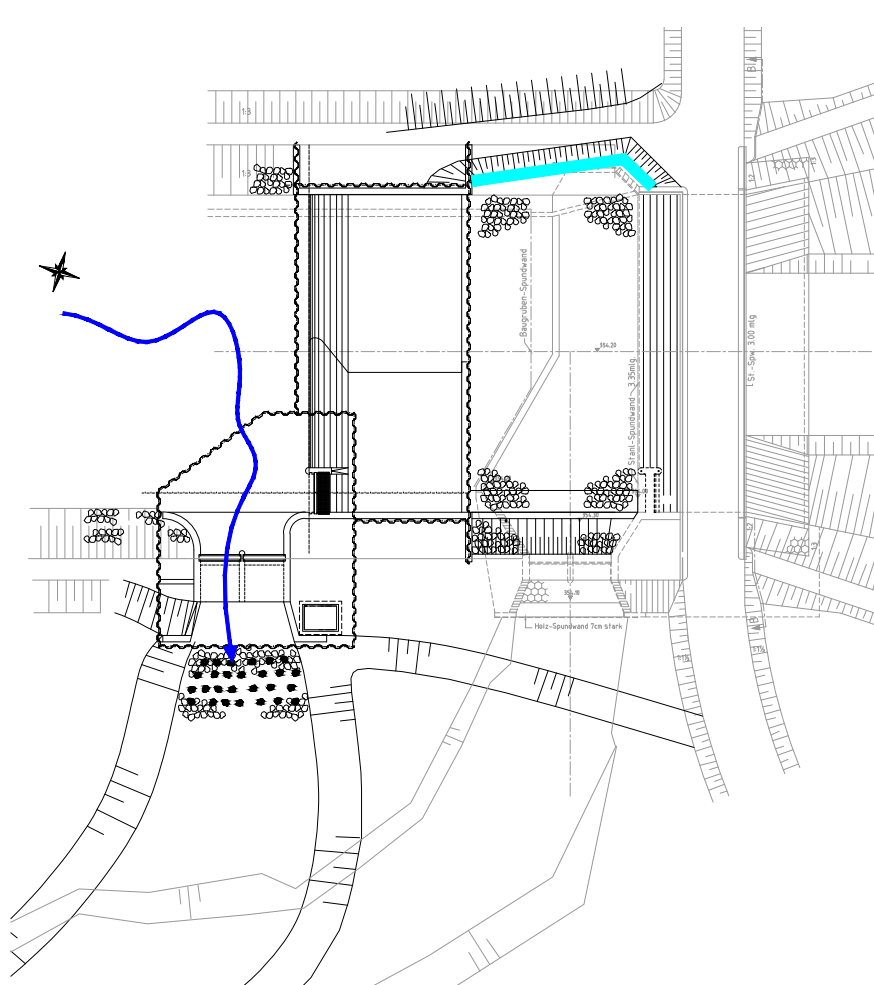


- Schritt 2:
- Abbruch festes Wehr und Grundablass

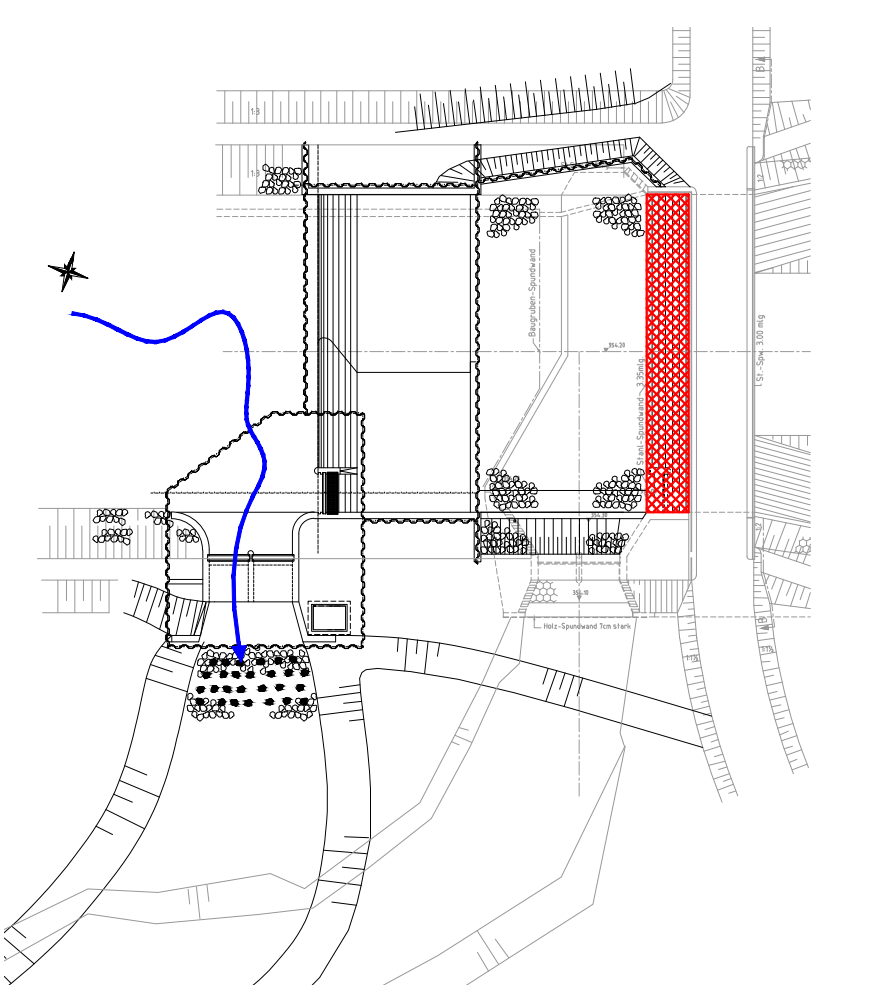


- Schritt 3:
- Abbruch Vorboden
- Aushubarbeiten für Versteinerung
- Egalisierung der Abbruchflächen

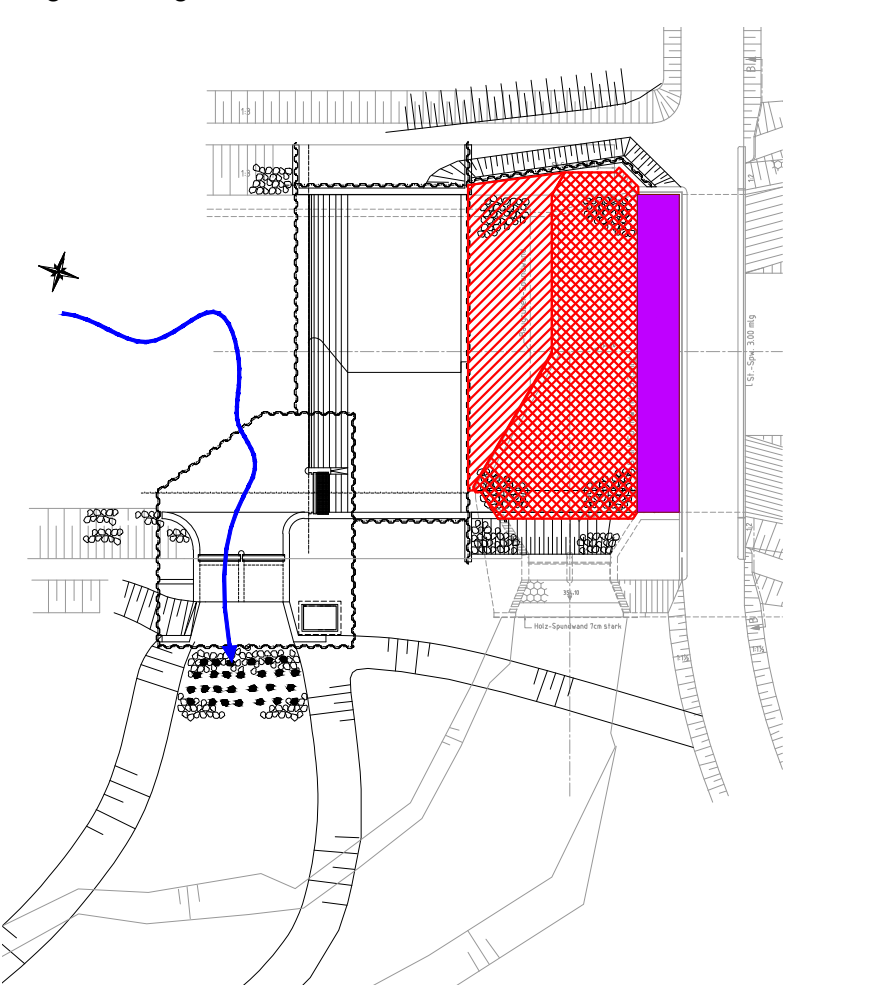

- Schritt 4:
- Versteinerung
- Erstellung Mauer auf der rechten Seite
- Erstellung Restwassereinlaufbauwerk im Schutz eines temporären Trenndamms

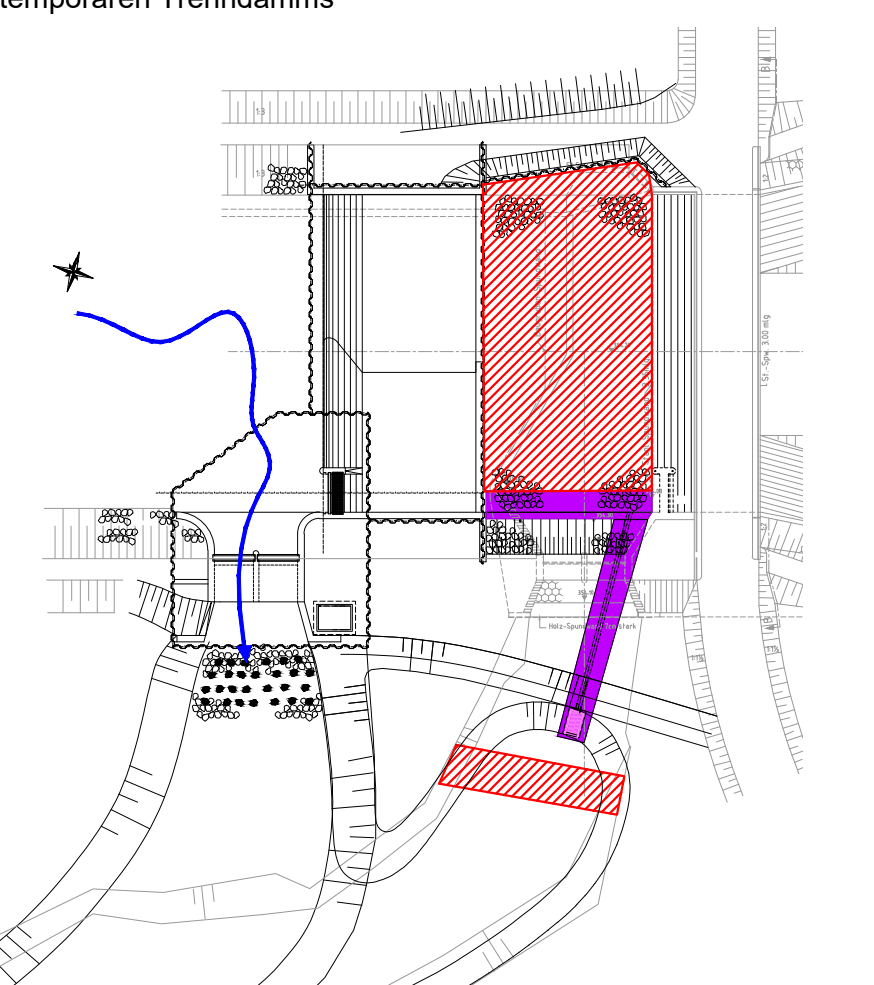

- Schritt 5:
- Teilabbruch Einlaufbauwerk und Verfüllung bis zum Restwassereinlaufbauwerk
- Böschungsanschlüsse mit Versteinerung
- Ergänzung des Kolkschutzes am Auslauf

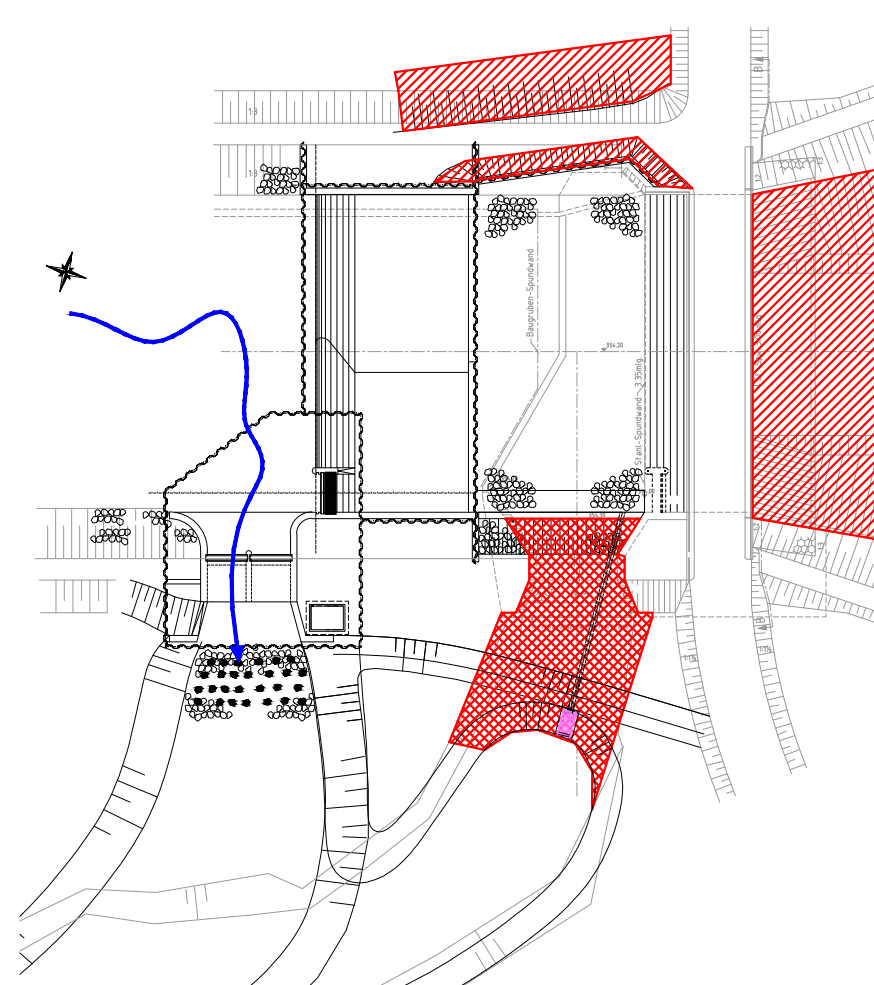

Prüf- und Genehmigungshinweise:

	c		
	b		
	a		
Änderungen:			
Nr.	Datum:	Name:	
Vorhaben:		Planungsstand, Anlage Nr.:	
Vorhabensträger:		Teil 2 zur Genehmigungs-	
Landkreis:		planung Teil 1 v. 12.09.2022	
Gemeinde:		Plan-Nr.:	010
		Schutzvermerk, Dateiname:	
Maßstab:		Ausgabe vom	
		Ersatz für	
		Ursprung	
Wasserwirtschaftsamt		Datum	Name
Landshut		bear.	Juni 2020
Vorhabensträger		gez.	Juni 2020
28.09.2023		gepr.	Juni 2020
Datum		Unterschrift	
12.09.2022		Unterschrift	
		914-145 - Genehmigungsplanung	
